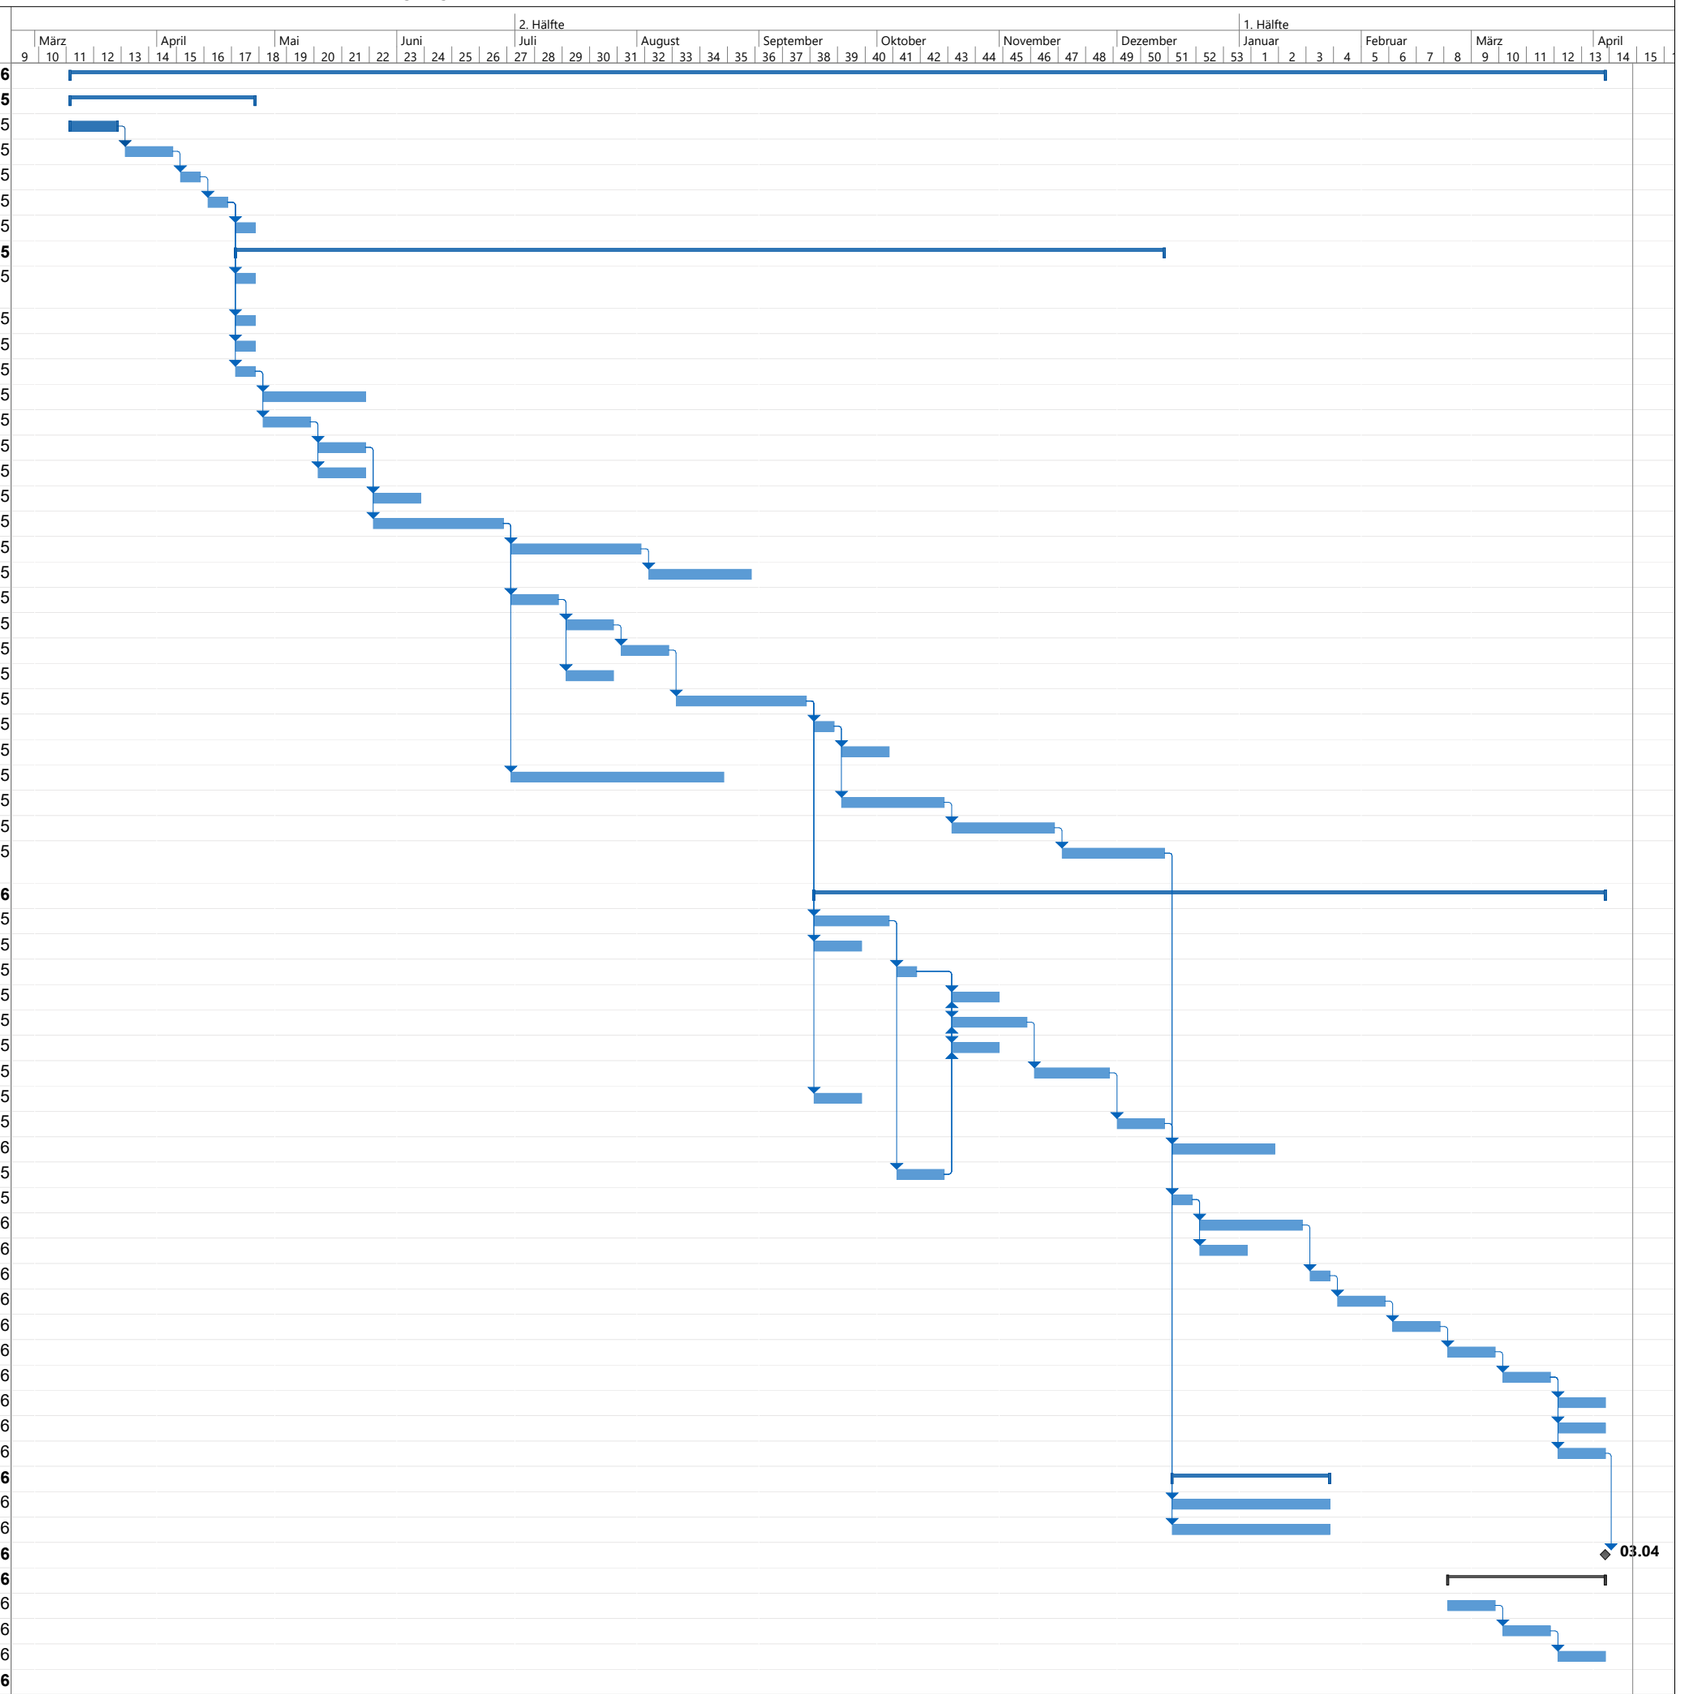Nr.	Vorgangsm	Task Name	Dauer	Anfang	Ende
1		**Bauphase**	**280 Tage**	**Mon 10.03.25**	**Fre 03.04.26**
2		**Baufeld/ Aussenanlagen**	**35 Tage**	**Mon 10.03.25**	**Fre 25.04.25**
3		Baufeldfreimachung	10 Tage	Mon 10.03.25	Fre 21.03.25
4		Bergung/ Sicherung	10 Tage	Mon 24.03.25	Fre 04.04.25
5		Baugrube/ Erschließung	5 Tage	Mon 07.04.25	Fre 11.04.25
6		Grundleitungen	5 Tage	Mon 14.04.25	Fre 18.04.25
7		Verfüllung Baugrube	5 Tage	Mon 21.04.25	Fre 25.04.25
8		**Rohbau**	**170 Tage**	**Mon 21.04.25**	**Fre 12.12.25**
9		Abbruch Scheunengiebel/ Dach/OG Scheune	5 Tage	Mon 21.04.25	Fre 25.04.25
10		Abbruch Schuppen	5 Tage	Mon 21.04.25	Fre 25.04.25
11		Abbruch Gefache/ Decke OG Haus	5 Tage	Mon 21.04.25	Fre 25.04.25
12		Rückbau Dachdeckung Haus	5 Tage	Mon 21.04.25	Fre 25.04.25
13		Ertüchtigung Fundamente	20 Tage	Mon 28.04.25	Fre 23.05.25
14		Fundamente Scheune	10 Tage	Mon 28.04.25	Fre 09.05.25
15		Fundamente Anbau	10 Tage	Mon 12.05.25	Fre 23.05.25
16		Wände Mauerwerk Scheune neu	10 Tage	Mon 12.05.25	Fre 23.05.25
17		Wände Mauerwerk Anbau neu	10 Tage	Mon 26.05.25	Fre 06.06.25
18		Dachstuhl/ Fachwerk OG reparieren	25 Tage	Mon 26.05.25	Fre 27.06.25
19		Dachstuhl/ OG Scheune reparieren	25 Tage	Mon 30.06.25	Fre 01.08.25
20		Galerie Scheune einbauen	20 Tage	Mon 04.08.25	Fre 29.08.25
21		Dachkonstruktion massiv Anbau neu	10 Tage	Mon 30.06.25	Fre 11.07.25
22		Dachdeckung Haus und Scheune	10 Tage	Mon 14.07.25	Fre 25.07.25
23		Dachklempner Haus und Scheune	10 Tage	Mon 28.07.25	Fre 08.08.25
24		PV-Anlage Scheune	10 Tage	Mon 14.07.25	Fre 25.07.25
25		Decken Haus reparieren/ sanieren	25 Tage	Mon 11.08.25	Fre 12.09.25
26		Bodenplatten Scheune/ Anbau	5 Tage	Mon 15.09.25	Fre 19.09.25
27		Abdichtung Haus und Scheune	10 Tage	Mon 22.09.25	Fre 03.10.25
28		Aussentüren/ Fenster Bestellzeit	40 Tage	Mon 30.06.25	Fre 22.08.25
29		Aussentüren/ Fenster neu/ repariere	20 Tage	Mon 22.09.25	Fre 17.10.25
30		Aussenputz/ Fassade Haus	20 Tage	Mon 20.10.25	Fre 14.11.25
31		Verschalung/ Dämmung Fassade Haus und Scheune	20 Tage	Mon 17.11.25	Fre 12.12.25
32		**Innenausbau**	**145 Tage**	**Mon 15.09.25**	**Fre 03.04.26**
33		Dielung/ Holzböden	15 Tage	Mon 15.09.25	Fre 03.10.25
34		Einbau Treppen Haus und Scheune	10 Tage	Mon 15.09.25	Fre 26.09.25
35		Trockenbau Wände halbseitig	5 Tage	Mon 06.10.25	Fre 10.10.25
36		Trockenbau Decke	10 Tage	Mon 20.10.25	Fre 31.10.25
37		Elektroinstallationen Rohinstallation	15 Tage	Mon 20.10.25	Fre 07.11.25
38		HLS-Installationen Rohinstallation	10 Tage	Mon 20.10.25	Fre 31.10.25
39		Innenputz/ Innendämmung	15 Tage	Mon 10.11.25	Fre 28.11.25
40		Aufzug	10 Tage	Mon 15.09.25	Fre 26.09.25
41		Dämmung Bodenplatten	10 Tage	Mon 01.12.25	Fre 12.12.25
42		Natursteinplatten	20 Tage	Mon 15.12.25	Fre 09.01.26
43		Trockenbau Wände vollständig	10 Tage	Mon 06.10.25	Fre 17.10.25
44		Estrich	5 Tage	Mon 15.12.25	Fre 19.12.25
45		Estrichtrocknung	20 Tage	Mon 22.12.25	Fre 16.01.26
46		Innentüren/ Tischler	10 Tage	Mon 22.12.25	Fre 02.01.26
47		Estrichbeschichtung	5 Tage	Mon 19.01.26	Fre 23.01.26
48		Fliesenleger Wand	10 Tage	Mon 26.01.26	Fre 06.02.26
49		Fliesenleger Boden	10 Tage	Mon 09.02.26	Fre 20.02.26
50		Maler	10 Tage	Mon 23.02.26	Fre 06.03.26
51		Bearbeitung Wandoberflächen	10 Tage	Mon 09.03.26	Fre 20.03.26
52		Sicherheitsbeleuchtung/ Brandschut	10 Tage	Mon 23.03.26	Fre 03.04.26
53		HLS-Feininstallationen	10 Tage	Mon 23.03.26	Fre 03.04.26
54		Elektro Feinistallationen	10 Tage	Mon 23.03.26	Fre 03.04.26
55		**Aussenanlagen**	**30 Tage**	**Mon 15.12.25**	**Fre 23.01.26**
56		Verkehrsflächen	30 Tage	Mon 15.12.25	Fre 23.01.26
57		Grünflächen	30 Tage	Mon 15.12.25	Fre 23.01.26
58		**Übergabe**	**0 Tage**	**Fre 03.04.26**	**Fre 03.04.26**
59		**Möblierung**	**30 Tage**	**Mon 23.02.26**	**Fre 03.04.26**
60		Gastro/ Ausstattung	10 Tage	Mon 23.02.26	Fre 06.03.26
61		Museumsausstattung	10 Tage	Mon 09.03.26	Fre 20.03.26
62		Orientierung/ Information	10 Tage	Mon 23.03.26	Fre 03.04.26
63		**Aufnahme der Nutzung**	**1 Tag**	**Fre 10.04.26**	**Fre 10.04.26**
